

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **1142**
Del **25 AGO, 2020**

OGGETTO: AREA GESTIONE TECNICA – Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”. Approvazione modifica cronoprogramma lavori - liquidazione anticipazione 20,00% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 in favore della Società Astaldi S.p.A. (Mandataria).

CUP: D67B14000530001 - CIG: 72202155E7

Il Direttore Generale

Vista la deliberazione n. 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Tecnica, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

Premesso che:

- l'intervento di realizzazione del "Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano" è inserito nel Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS 2007-2013) secondo quanto previsto dalla Deliberazione CIPE n. 166/2007, approvata dalla Regione Puglia con Del di G.R. N. 2033 del 27.10.2009;
- con Del. di G. R. N. 2787/2012 di presa atto della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'APQ "Benessere e Salute" a valere sulla Delibera CIPE n. 92/2012, successivamente ridotta con Deliberazione di G.R. n. 652/2014, si finanziava, tra gli altri interventi, la realizzazione, per € 80.000.000,00, del Nuovo Ospedale del Sud-Est barese Monopoli Fasano;
- con Delibera del D. G. N.1569 del 28.8.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento l'Ing. Nicola Sansolini e la relativa struttura di supporto costituita da personale tecnico ed amministrativo in servizio presso l'A.G.T.;
- codesta Stazione Appaltante nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, facendo riferimento ai rapporti conclusivi delle attività di verifica, sottoscriveva l'atto conclusivo di validazione e contestualmente provvedeva ad approvare, per ognuno dei livelli, la relativa progettazione come di seguito indicato:
 - a) Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 27 del 13.01.2017 di approvazione della Progettazione Preliminare;
 - b) Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 1094 del 13.06.2017 di approvazione della Progettazione Definitiva [La progettazione definitiva è stata oggetto di conferenza di servizi indetta con nota 16324/UOR01 del 24.01.2017 a cui segue il provvedimento determinativo n. 5670 del 03.05.2017 di conclusione];
 - c) Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 1652 del 19.09.2017 di approvazione della Progettazione esecutiva avente ad oggetto "Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano";

- il Dipartimento di Promozione della Salute della regione Puglia a seguito di corrispondenza con la Direzione Strategica della ASL Bari, con l'atto Dirigenziale n. 2 del 06.04.2017 e con successivi provvedimenti [cfr. *Delibera del Direttore Generale Asl Bari n.1505 del 20.09.2018*], assicurava il finanziamento dell'opera attraverso le seguenti fonti: la spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale [lavori e oneri per la sicurezza] ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione [comprehensive di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza] [rif. *approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018*] risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
 - per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ “Benessere e Salute” (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
 - per € 16.000.000,00 sul fondo europeo sviluppo regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
 - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019);
- in esecuzione della Delibera del Direttore Generale della ASL Bari 1679 del 28.09.2017 venivano approvato il Bando ed il Disciplinare di gara e contestualmente si procedeva all'indizione di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, per la sola esecuzione, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per contratto da stipularsi a corpo;
- successivamente all'esperienza di tutte le procedure previste dalla vigente normativa di settore, con Delibera del Direttore Generale n. 2445 del 30.12.2017, è stata proposta l'aggiudicazione dei “Lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud-Est Barese – Monopoli-Fasano” in favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. via G. V. Bona n.65 Roma - Guastamacchia S.p.A. via P. Ravanas n.2 Ruvo di Puglia;
- con Delibera del Direttore Generale della ASL Bari n. 631 del 283.03.2018 2018 veniva dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei <<Lavori di realizzazione del “Nuovo Ospedale del Sud Est Barese – Monopoli-Fasano”>> a favore dell'RTI ASTALDI S.p.A. – GUASTAMACCHIA S.p.A per l'importo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00% per complessive € 80.590.266,11;
- al fine di aderire alla richiesta pervenuta dagli organi regionali ed essenzialmente al fine di rimodulare i Q.E. con maggiore accuratezza ed attendibilità, con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018 è stato approvato il Q.E. generale di spesa rimodulato in € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza), € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprehensive di opere opzionali al netto per € 3.594.706,76);
- in data 07.09.2018 con rep. n. 403 veniva sottoscritto in forma digitale il contratto d'appalto per il corrispettivo contrattuale di € 73.263.878,28 oltre IVA 10,00%;

Richiamati

- l'art. 35, comma 18, d. lgs. n. 50/2016 che disciplina le modalità di erogazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20 % del prezzo di appalto;
- il D.M n. 31/2018 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che elenca gli schemi tipo di polizza fidejussoria da sottoscrivere per richiedere l'anticipazione contrattuale;

Considerato che

- con nota n. 1738 del 18.10.2019 la mandataria Astaldi spa comunicava l'intenzione di chiedere l'erogazione dell'anticipazione contrattuale nella misura del 20% del prezzo di appalto dietro rilascio di n. 2 garanzie fidejussorie. A seguito di tanto non si procedeva alla trasmissione di alcuna copia della polizza fidejussoria per la verifica preliminare;
- con nota prot. n. 301044 del 19.11.2019, avendo appreso per le vie brevi l'intenzione delle componenti del RTI di presentare due distinte tipologie di polizze (una assicurativa l'altra bancaria) con differenti gradi di garanzia per la stazione appaltante, il RUP chiedeva l'emissione di un'unica polizza bancaria con invito a presentare copia prima della materiale sottoscrizione della stessa da parte dell'A.T.I.;
- con nota prot. n. 2159 del 06.12.2019 la mandataria Astaldi spa precisava che le due polizze sarebbero state conformi al D.M. n. 31/2018 che prevede schemi di garanzia con più garanti, tuttavia, anche in questa occasione, non trasmetteva alcuna copia di polizza ai fini della valutazione preventiva;
- con nota prot. n. 32532 del 07.02.2020, il RUP invitava nuovamente l'A.T.I. a trasmettere bozza delle garanzie al fine di verificarne la corrispondenza agli schemi di cui al D.M. n. 31/2018;
- con nota n. 423 del 27.02.2020, la mandataria trasmetteva bozza del testo di garanzie dell'A.T.I. in base allo schema 1.3 del DM n. 31/2018, carente dei riferimenti dei Garanti, dell'importo delle medesime, nonché della data di decorrenza della validità della polizza;
- con nota prot. n. 51737 del 09.03.2020, il RUP -lamentando la mancanza delle informazioni necessarie per effettuare qualsiasi istruttoria- rinnovava all'A.T.I. l'invio delle polizze nella quale specificare:

- a) la tipologia di garanzie che si intende stipulare unitamente ai riferimenti dei Garanti;
 - b) la data di decorrenza dell'anticipazione;
 - c) l'importo contrattuale su cui calcolare il 20% di anticipazione prevista (importo contrattuale detratti i SAL già maturati alla data di sottoscrizione delle garanzie);
 - d) il cronoprogramma dei lavori a cui far riferimento per l'applicazione del tasso d'interesse;
- in data 19.03.2020 la stazione appaltante riceveva una comunicazione, acclarata al protocollo n. 58224 del 23.03.2020, da parte della mandante Guastamacchia spa con la quale la stessa comunicava di essere in procinto di emettere una polizza assicurativa con compagnia bulgara autorizzata da IVASS al ramo di rischio 15;
 - la stazione appaltante, avviate le verifiche previste per legge, non ha potuto verificare la solidità della compagnia proposta. L'atteggiamento prudenziale tenuto dalla stazione appaltante è coerente alle indicazioni fornite nel documento redatto in data 28.05.2020 da Banca d'Italia, IVASS, ANAC e Autorità garante della concorrenza e del mercato;
 - con nota prot. n. 65911 del 15.04.2020, il RUP eccepiva altresì che la bozza di garanzia proposta (rif. n. 423/2020) seguiva il modello di cui allo schema-tipo 1.3 del D.M. n. 31/2018 anziché dello schema 1.3.1. "Garanzia fidejussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti" indicato per il caso di specie. Nella medesima nota sottolineava che la differenza sostanziale, posta a cautela della stazione appaltante, è rappresentata dal vincolo di solidarietà dei due Garanti nei confronti della stazione appaltante;
 - con nota n. 666 del 30.04.2020, acclarata al protocollo n. 73131 del 05.05.2020, la Società Astaldi S.p.A. richiedeva un sostegno finanziario per supportare la ripresa delle attività in conseguenza della situazione di generale difficoltà generata dall'emergenza Covid-19, mediante l'istituto dell'erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi della vigente normativa, e comunque per un importo di € 9.201.861,07;
 - con nota del 12.05.2020, prot. aziendale n. 78160/2020, la società mandante Guastamacchia spa trasmetteva bozza di una polizza fidejussoria per la quota del 30% del valore dell'anticipazione emessa da una diversa compagnia assicurativa rispetto alla prima, indicando quale secondo garante la compagnia Unicredit spa. Tale polizza fidejussoria non si è mai concretizzata;
 - con nota prot. n.81709 del 26.05.2020, di riscontro alla nota Astaldi 666/2020, il RUP eccepiva ancora una volta la mancata costituzione di una polizza fidejussoria rispondente ai requisiti di legge;
 - con successiva nota prot. n. 87808 del 09.06.2020, indirizzata ad entrambe le componenti dell'A.T.I., Il RUP lamentava che, nonostante i ripetuti solleciti e richiami, non fossero pervenute le garanzie di legge necessarie per l'erogazione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 smi;
 - in riscontro a tale nota la società mandataria Guastamacchia spa comunicava (rif. prot. n. 92078 del 17.06.2020) avrebbe proceduto alla stipula di una polizza di cui allo schema tipo 1.3. del DM 31/2018, in diffinità con la bozza presentata in data 12.05.2020;
 - a seguito di tanto con nota 23/2020, acclarata al prot. n. 95624 del 24.06.2020, la mandante trasmetteva polizza fidejussoria finalizzata all'ottenimento del 30% della quota di anticipazione contrattuale, indicando quale contraente esclusivamente la società Guastamacchia spa e non l'intera A.T.I.;
 - con nota prot. n. 96391 del 25.06.2020, il RUP nel comunicare alla mandataria di quanto trasmesso dalla mandante ribadiva *"ancora una volta che la polizza a garanzia dell'anticipazione ad erogarsi dovrebbe essere unica, indicando quale contraente ed obbligato principale il RTI e, segnatamente, il soggetto che ne ha la rappresentanza legale, cioè la capogruppo mandataria. Questa stazione appaltante, venendo incontro alle esigenze prospettate dalla mandante, ha sì consentito la presentazione di due polizze, ferma comunque la solidarietà tra i contraenti ed obbligati principali e, per tale ragione, si è reiteratamente ribadito, in molteplici missive, che le fideiussioni dovranno necessariamente uniformarsi allo schema previsto dal Decreto n.31 del 2018, modello 1.3.1.Quella, irrualmente, presentata dalla società Guastamacchia non è in ogni caso conforme al modello prescritto e, quindi, non garantisce pienamente la Stazione appaltante, con le inevitabili responsabilità anche di carattere erariale, aggravate dall'entità della anticipazione ad erogarsi, che rendono massime le garanzie per il soggetto beneficiario. Conseguentemente, questa stazione appaltante ribadisce che polizza fidejussoria trasmessa è del tutto inidonea a consentire la erogazione dell'anticipazione contrattuale"*. Nella medesima nota ribadiva, nel contempo, la necessità che tutte le comunicazioni relative al rapporto contrattuale fossero veicolate esclusivamente dalla capogruppo mandataria, così come prescritto dalla normativa di settore;
 - con pec del 25.06.2020, protocollata al n. 98620 del 01.07.2020, la società Astaldi ha anticipato e poi ha trasmesso l'originale della polizza assicurativa emessa per l'intero A.T.I. e redatta in base al modello 1.3 del DM n. 31/2018;
 - con nota del 30.06.2020, prot. n. 99805 del 02.07.2020, la capogruppo mandataria Astaldi, inoltre, ha segnalato che la polizza presentata dalla Guastamacchia spa non è conforme ai rapporti contrattuali in quanto la mandante è priva ex lege dei necessari poteri per poter impegnare l'A.T.I. nei confronti della stazione appaltante. Nella medesima nota ha sottolineato che, in qualità di capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria *"la richiesta di liquidazione in favore della società nella propria dedotta qualità, riguarda il solo importo garantito e, per la precisazione, il 70% dell'anticipazione contrattualmente prevista"*.

Rilevato che

- con procedimento n. 63/2018 innanzi al Tribunale di Roma, Astaldi spa ha proposto concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F.;
- con Decreto del 06.12.2018, il Tribunale di Roma Sez. Fallimentare ha autorizzato la prosecuzione dei contratti in corso alla data di deposito del ricorso fra cui compare la commessa 9481 "Lavori di costruzione del Nuovo Ospedale del Sud Est barese Monopoli-Fasano";
- con ordinanza n. 2900/2020 del 17.07.2020 RG 26945/2020, il Tribunale di Roma ha omologato il concordato preventivo n. 63/2018 proposto da Astaldi spa stabilendo le modalità di esecuzione della proposta concordataria e di sorveglianza;
- è intenzione dell'Amministrazione intraprendere ogni utile azione per consentire il prosieguo dei lavori di cantiere anche per recuperare i ritardi correlati all'emanazione del DPCM del 22.03.2020 che ha disposto la sospensione di tutte le attività produttive, industriali e commerciali a causa della pandemia da COVID-19.

Richiamato l'art. 35, comma 18, d.lgs. n.50/2016 relativamente all'erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto da corrispondere all'appaltatore;

Visti

- la polizza fideiussoria n. 460011733202 emessa dalla UNICREDIT S.p.A. in data 25.06.2020, dell'importo di €. 9.201.861,07 (importo comprensivo della maggiorazione del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori), a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale, acquisita al prot. n. 98620/2020 del 01/07/2020, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il nuovo cronoprogramma trasmesso dalla Direzione lavori e dalla capogruppo mandataria dell'ATI che tiene conto dei 49 giorni di ritardo a causa del fermo cantiere a seguito dell'emergenza COVID 19;
- la corretta inventariazione della spesa di cui alla scheda n. 313819 [inventario cespite]

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL n. 15342038 con scadenza al 25.06.2020 rientrante nella fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 81 del decreto-legge 34/2020 (rif. messaggio INPS n. 2998/2020), con esito regolare;

Precisato che i dati identificativi di progetto e di gara risultano essere i seguenti:

- CUP: D67B14000530001
- CIG: 72202155E7

Ritenuto di

- approvare il nuovo cronoprogramma dei lavori, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale, che tiene conto della sospensione del cantiere a causa del Covid19 spostando la data di fine lavori dal 06/09/2021 al 25/10/2021
- riconoscere all'Impresa capogruppo dell'ATI di che trattasi l'importo di anticipazione calcolato sul valore residuo delle opere eseguite al SAL n.5, secondo il seguente schema:

importo contrattuale (A)	Opere realizzate al 5 SAL (B)	base su cui calcolare l'anticipazione contrattuale [C=(A-B)]	importo anticipazione contrattuale (D)	Anticipazione spettante all'ATI Astaldi spa/Guastamacchia spa [E= (70%D)]
73.263.878,28	7.536.299,21	65.727.579,07	13.145.515,81	9.201.861,07


-prendere atto ed accettare la relativa fattura n. 10/CPA del 24.06.2020 emessa dalla società mandataria Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65 — P. IVA IT00880281001 dell'importo di € 9.201.861,07 oltre IVA al 10% per € 920.186,11 per un totale della fattura di € 10.122.047,18;

-liquidare la lista n. 19794 del 06/08/2020 allegata, unitamente al DURC, alla presente Deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale

La Dirigente Amministrativa: Concetta Ladalardo



Il Dirigente Responsabile U.O.S. C.R.A. Ing. Nicola Iacobellis





Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.


DELIBERA

assunto quanto in premessa di:

1. Approvare il nuovo cronoprogramma dei lavori, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale (All.1), che tiene conto della sospensione del cantiere a causa del Covid19 spostando la data di fine lavori dal 06/09/2021 al 25/10/2021;
2. Dare atto che la Società mandataria ha presentato, a nome dell'ATI Astaldi spa/Guastamacchia spa, la polizza fideiussoria n. 460011733202 emessa dalla UNICREDIT S.p.A. in data 25.06.2020, dell'importo di €. 9.201.861,07, acquisita al prot. n. 98620 del 01/07/2020, a garanzia del 70% dell'anticipazione del prezzo contrattuale, così determinata ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, calcolato sul valore residuo delle opere da eseguirsi al SAL n.5;
3. Riconoscere all'Impresa Astaldi spa, mandataria dell'ATI per i lavori in argomento, la quota parte al 70% dell'importo dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 d.lgs. 50/2016, ammontante ad € 9.201.861,07 oltre IVA al 10% per € 920.186,11 per complessivi € 10.122.047,18, erogabile all'A.T.I. ai sensi dell'art. 24 del Contratto di Appalto;
4. Disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento in anticipazione con i fondi di bilancio, come da disposizione del Direttore Generale del 07.09.2015 prot. N. 164613, da reintegrare ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia, con le modalità previste nelle dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973, dell'importo complessivo di € 10.122.047,18 (IVA compresa), pari alla quota del 70% in favore della società Astaldi S.p.A. come da lista di liquidazione n.ro 19794 del 06/08/2020, allegata unitamente al DURC alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale (All.2 e 3), a saldo della fattura N. 10/CPA del 24.06.2020 emessa dalla Società mandataria Astaldi S.p.A.;
5. Precisare che l'importo di € 920.186,11 (IVA 10,00%) sarà trattenuto e versato all'Erario in applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto "split payment";
6. Precisare che il versamento deve essere effettuato sul conto della società mandataria Astaldi S.p.A. con sede in Roma alla via G. V. Bona n.65 — P. IVA IT00880281001;
7. Di prendere atto che la richiesta di liquidazione avanzata dalla capogruppo mandataria, per conto dell'ATI, riguarda il solo importo garantito e, per la precisazione, il 70% dell'anticipazione contrattualmente prevista (nota prot. n. 99805/2020);
8. Dare atto che la suddetta spesa va imputata sul conto 020 – 110 – 00100 dell'esercizio finanziario 2020, precisando che il costo complessivo dell'intervento di € 114.300.000,00 di cui € 73.263.878,28 importo contrattuale (lavori e oneri per la sicurezza) ed € 41.036.121,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione (comprendente di € 3.594.706,76 per opere opzionali ed oneri per la sicurezza) (rif. *approvazione Q.E. rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018*) risulta finanziato attraverso le seguenti fonti:
 - per € 80.000.000,00 sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC 2007/2013) – APQ "Benessere e Salute" (A.D. 146/2014/2019 e 081/218/2019);
 - per € 16.000.000,00 sul Fondo Europeo Sviluppo Regionale (PO FESR 2014/2020) – Azione 9.12 (A.D. 081/243/2016);
 - per € 18.300.000,00 a valere sulle quote annue del fondo sanitario regionale (A.D. 081/199/2019).
9. Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie per gli adempimenti di conseguenza;
10. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti- Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche;
11. Disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché di essere soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
12. La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale e pubblicata per 15 giorni all'Albo dell'Azienda ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Alc

AZIENDA ASL BA - NUOVO OSPEDALE DI MONOPOLI FASANO - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

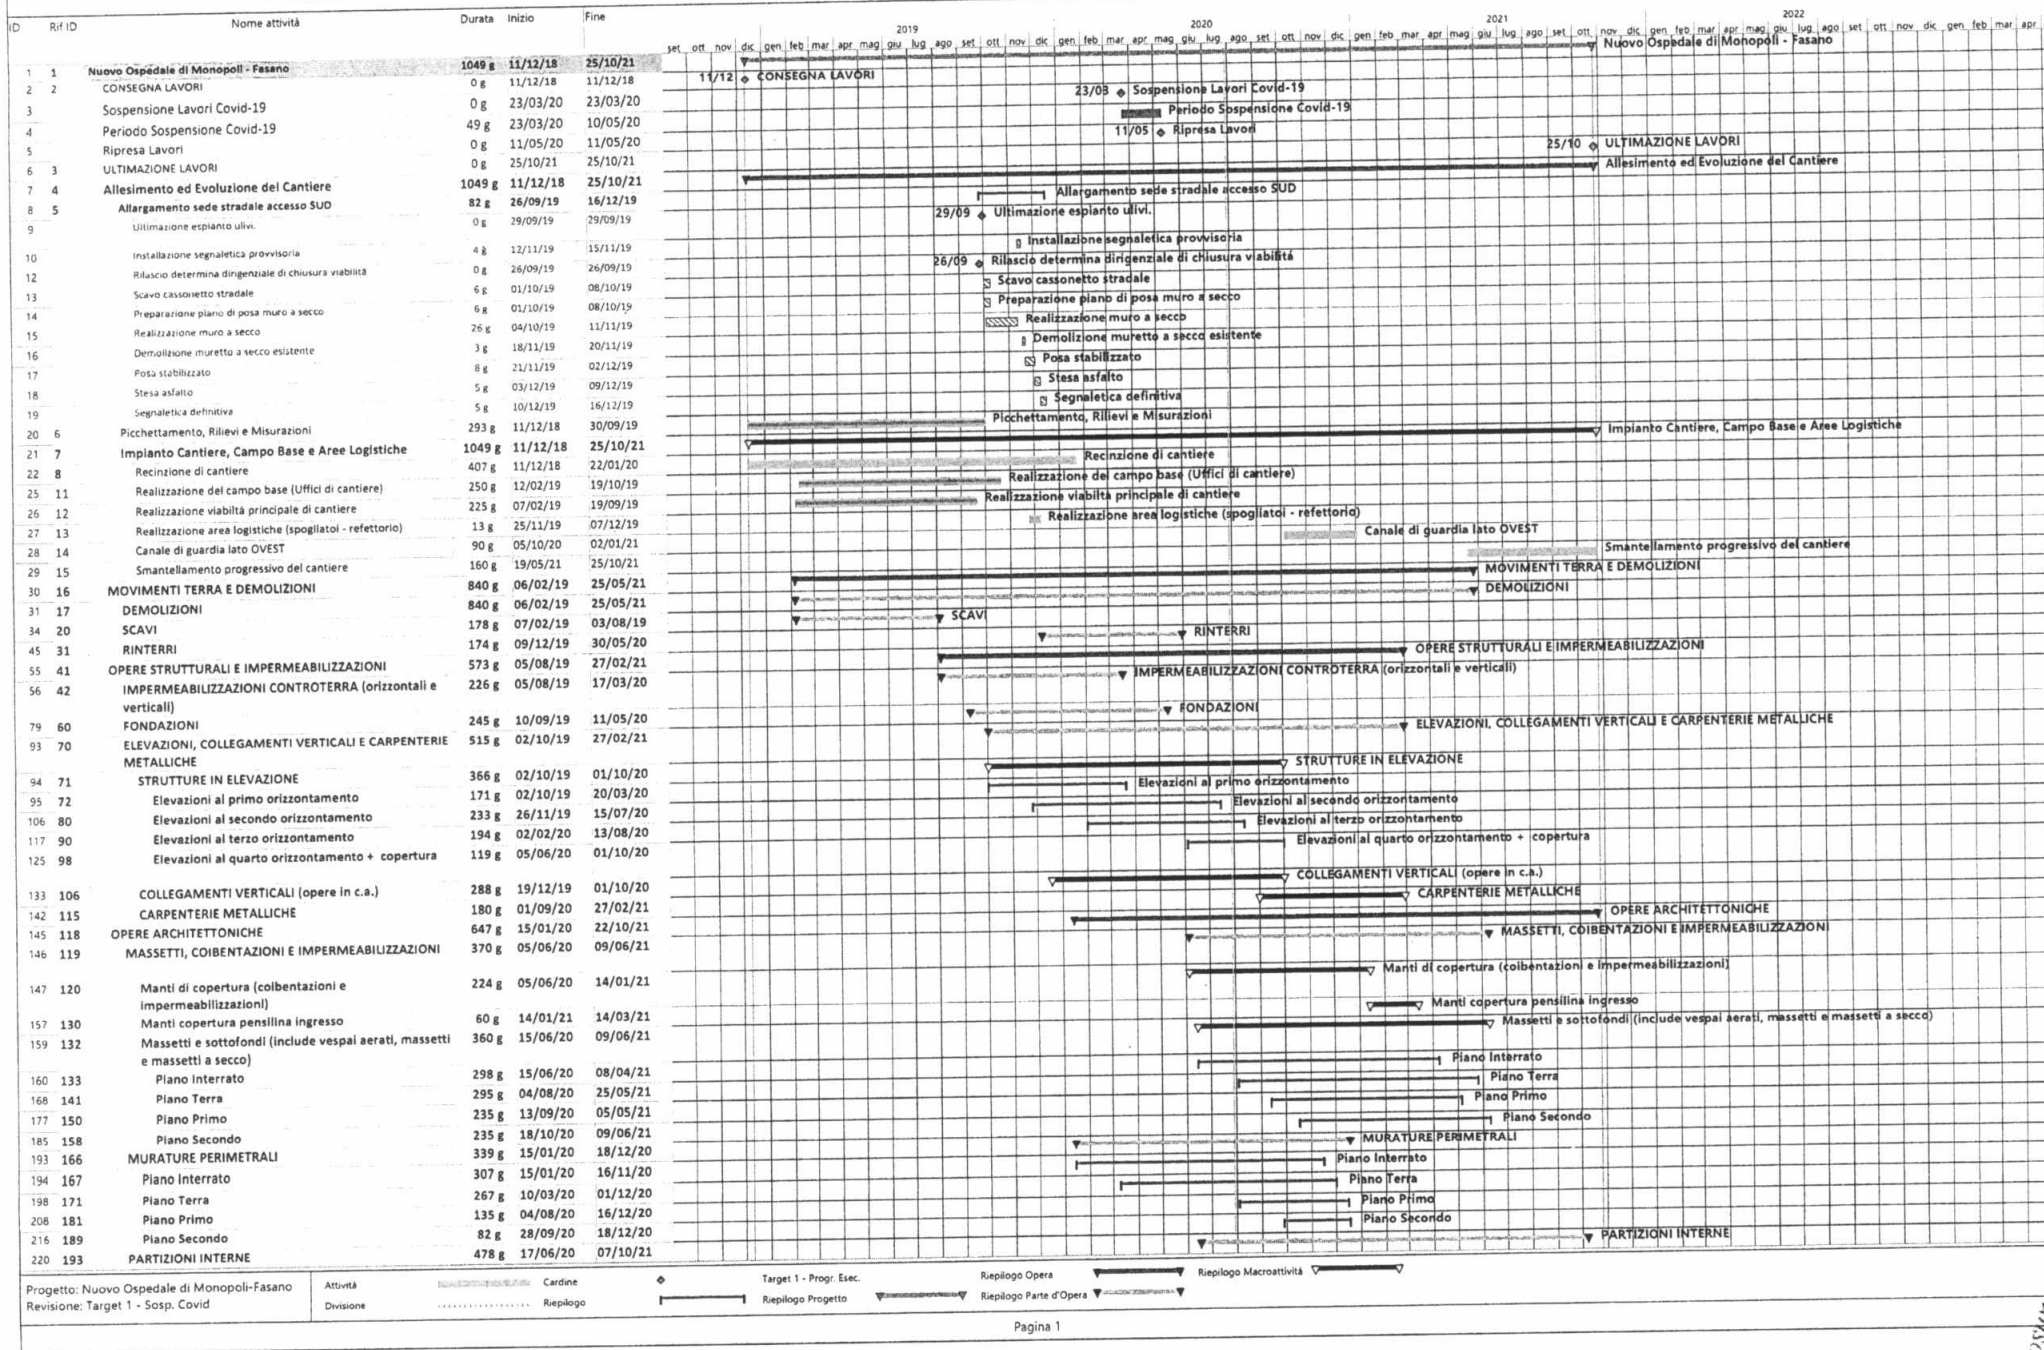

Progetto: Nuovo Ospedale di Monopoli-Fasano
 Revisione: Target 1 - Sosp. Covid

Attività: Cardine
 Divisione: Riepilogo

Target 1 - Progr. Esec.
 Riepilogo Progetto

Riepilogo Opera
 Riepilogo Parte d'Opera

Riepilogo Macroattività

AREA GESTIONE TAVOLI
 Ing. Nicola Simeoli

Alle-9

ASLBA

Regione Puglia
ASL BA
via LUNGOMARE STARITA, 6
70132 - BARI (BA)

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 19794

Del 06/08/2020

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;
Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;
Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

- (1) Rilevata la regolarità del DURC;
- (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;
- (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA

Macrostruttura: AREA TECNICA
Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2020 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO

CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI

Fornitore: (67827) ASTALDI SOCIETA' PER AZIONI

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT74D0200805351000105217356

<u>Prot. Electr.</u>	<u>Data Reg.</u>	<u>Numero Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Num. Ordine</u>	<u>Data Ordine</u>
0000UFUHO20001309438	24/06/2020	10/CPA	24/06/2020	€ 10.122.047,18	72202155E7		

<u>CIG</u>	<u>CUP</u>	<u>Importo</u>
72202155E7	D67B14000530001	€ 10.122.047,18

Totale Fornitore - 67827 € 10.122.047,18

TOTALE CONTO - 02011000100 € 10.122.047,18

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 5305 € 10.122.047,18

TOTALE FATTURE LIQUIDATE	€ 10.122.047,18
---------------------------------	------------------------

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 10.122.047,18

TOTALE IMPORTO DEL CIG 72202155E7 € 10.122.047,18

NOTE

CESP/313819



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20579838	Data richiesta	26/02/2020	Scadenza validità	25/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ASTALDI SPA IN CONCORDATO PIENO
Codice fiscale	00398970582
Sede legale	VIA G.V. BONA, 65 00156 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Parere del Direttore Amministrativo


Gianluca Capochiani


Parere del Direttore Sanitario

Silvana Fornelli




Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce



**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per €. _____

Conto economico n. _____ per €. _____

Conto economico n. _____ per €. _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Area

.....

.....

SERVIZIO ALBO PRETORIO


Pubblicazione n. **0102**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA

In data **26 AGO, 2020**

Bari: **26 AGO, 2020**

L'addetto all'Albo Pretorio on line



Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n..... del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.
